




PROGRAM STUDI
SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

MATA KULIAH
MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

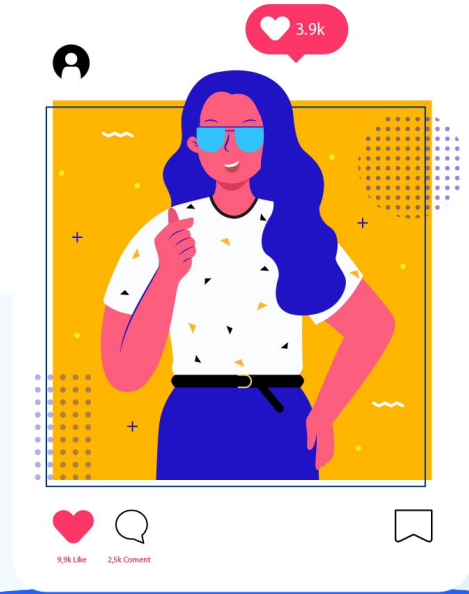

[Background](https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background)
vector created by freepik - www.freepik.com

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami SDM dalam proyek.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Kemampuan dalam merencanakan kebutuhan SDM dalam proyek.





APA ITU ***MANAJEMEN SDM?***



SDM



- Melibatkan manusia menjadi efektif dalam mengerjakan proyek
- Proses manajemen sumber daya manusia meliputi:
 - **Planning human resource management:**
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan project roles, responsibilities, and reporting relationships
 - **Acquiring the project team:**
menentukan siapa saja personel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sesuai boidangnya
 - **Developing the project team:** building individual and group skills to enhance project performance
Membangun *skill* individu dan grup untuk meningkatnya performen proyek
 - **Managing the project team:**
tracking anggota performa anggota tim, memotivasi anggota tim, memberikan waktu untuk memberikan *feedback*, penyelesaianissu dan konflik dalam tim dan mengkoordinasikan perunahan untuk meningkatkan performa proyek.

SDM



Planning

Process: **Plan human resource management**

Output: Human resource plan

Executing

Process: **Acquire project team**

Outputs: Project staff assignments, resource calendars, project management plan updates

Process: **Develop project team**

Outputs: Team performance assessments, enterprise environmental factors updates

Monitoring and Controlling

Process: **Manage project team**

Outputs: Change requests, project management plan updates, project documents updates, enterprise environmental factors updates, and organizational process assets updates

Project Start

Project Finish

Pengelolaan SDM



- Banyak penelitian dan pemikiran bagaimana menerapkan teori psikologis dan manajemen sumber daya manusia menjadi loyal untuk menempati kedudukan tertentu dalam tim proyek
- Hal yang penting berkaitan dengan manajemen proyek meliputi:
 - **motivation theories – teori motivasi**
 - **influence and power = pengaruh dan kekuasaan**
 - **Effectiveness – keefektifan**

Teori Motivasi



- Banyak penelitian dan pemikiran bagaimana menerapkan teori psikologis dan manajemen sumber daya manusia menjadi loyal untuk menempati kedudukan tertentu dalam tim proyek
- Hal yang penting berkaitan dengan manajemen proyek meliputi:
 - **Teori Motivasi/motivation theories**
 - **Pengaruh dan Kekuasaan/influence and power**
 - **Keefektifan/Effectiveness**

Teori Motivasi




- Banyak penelitian dan pemikiran bagaimana menerapkan teori psikologis dan manajemen sumber daya manusia menjadi loyal untuk menempati kedudukan tertentu dalam tim proyek
- Hal yang penting berkaitan dengan manajemen proyek meliputi:
 - **Teori Motivasi/motivation theories**
 - **Pengaruh dan Kekuasaan/influence and power**
 - **Keefektifan/Effectiveness**

Maslow Hierarchy



- Abraham Maslow berpendapat bahwa kualitas proses manusia yang unik yang menjadikan mereka dapat membuat pilihan secara indepen, sehingga hal tersebut membuat mereka dapat mestikan tujuan yang ingin dicapai.
- Dalam hal ini Maslow mengembangkan **hierarchy of needs** yang menyatakan bhwa perilaku manusia diarahkan dan didorong oleh kebutuhan yang sequence.

Maslow Hierarchy

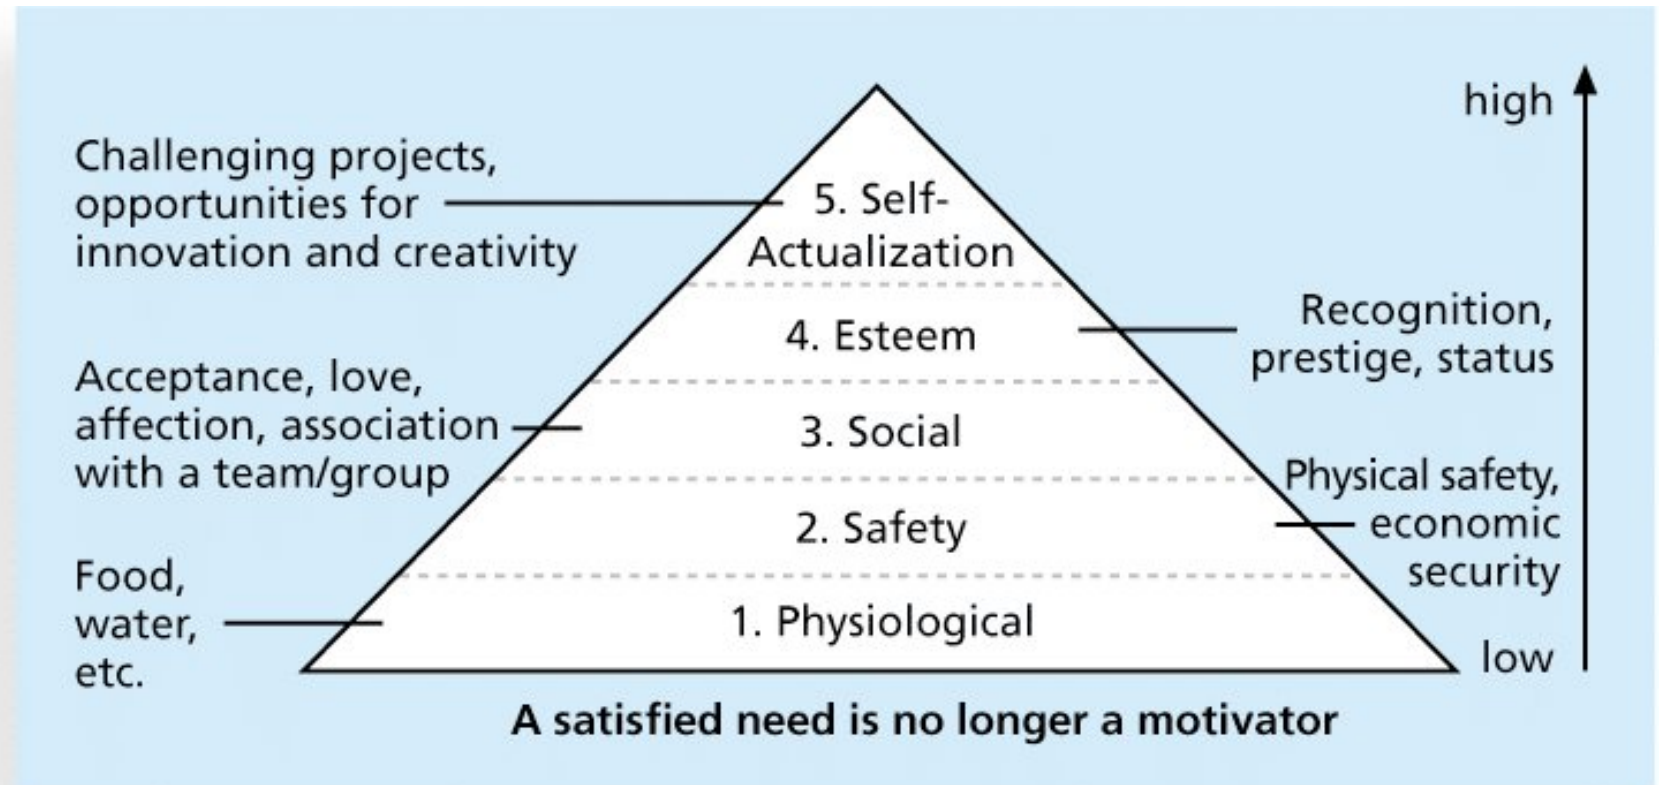

Pengaruh/Influence



- Proyek lebih sering dikatakan berhasil ketika Manajer Proyek dapat mempengaruhi dengan langkah:
 - mempraktikkan, memberikan *role model*
 - Tantangan dalam pekerjaan
- Sebaliknya, proyek dikatakan gagal jika Manjer Proyek terlalu menitik beratkan pada hal:
 - wewenang
 - uang
 - hukuman

Kekuasaan/Power




- **Kekuasaan/Power** adalah kemampuan yang potensial untuk mempengaruhi kebiasaan atau perilaku untuk mengajak manusia melakukan hal yang meskipun mereka tidak ingin melakukannya.
- Tipe tipe power meliputi:
 - Coercive - paksaan
 - Legitimate - pengesahan
 - Expert - keahlian
 - Reward - penghargaan
 - Referent - referensi

Perencanaan SDM




- Mengidentifikasi dan mendokumentasikan project roles, tanggung jawab dan reporting relationships
- Konten perencanaan sumber daya manusia meliputi:
 - project organizational charts
 - staffing management plan
 - responsibility assignment matrixes
 - resource histograms

Perencanaan SDM

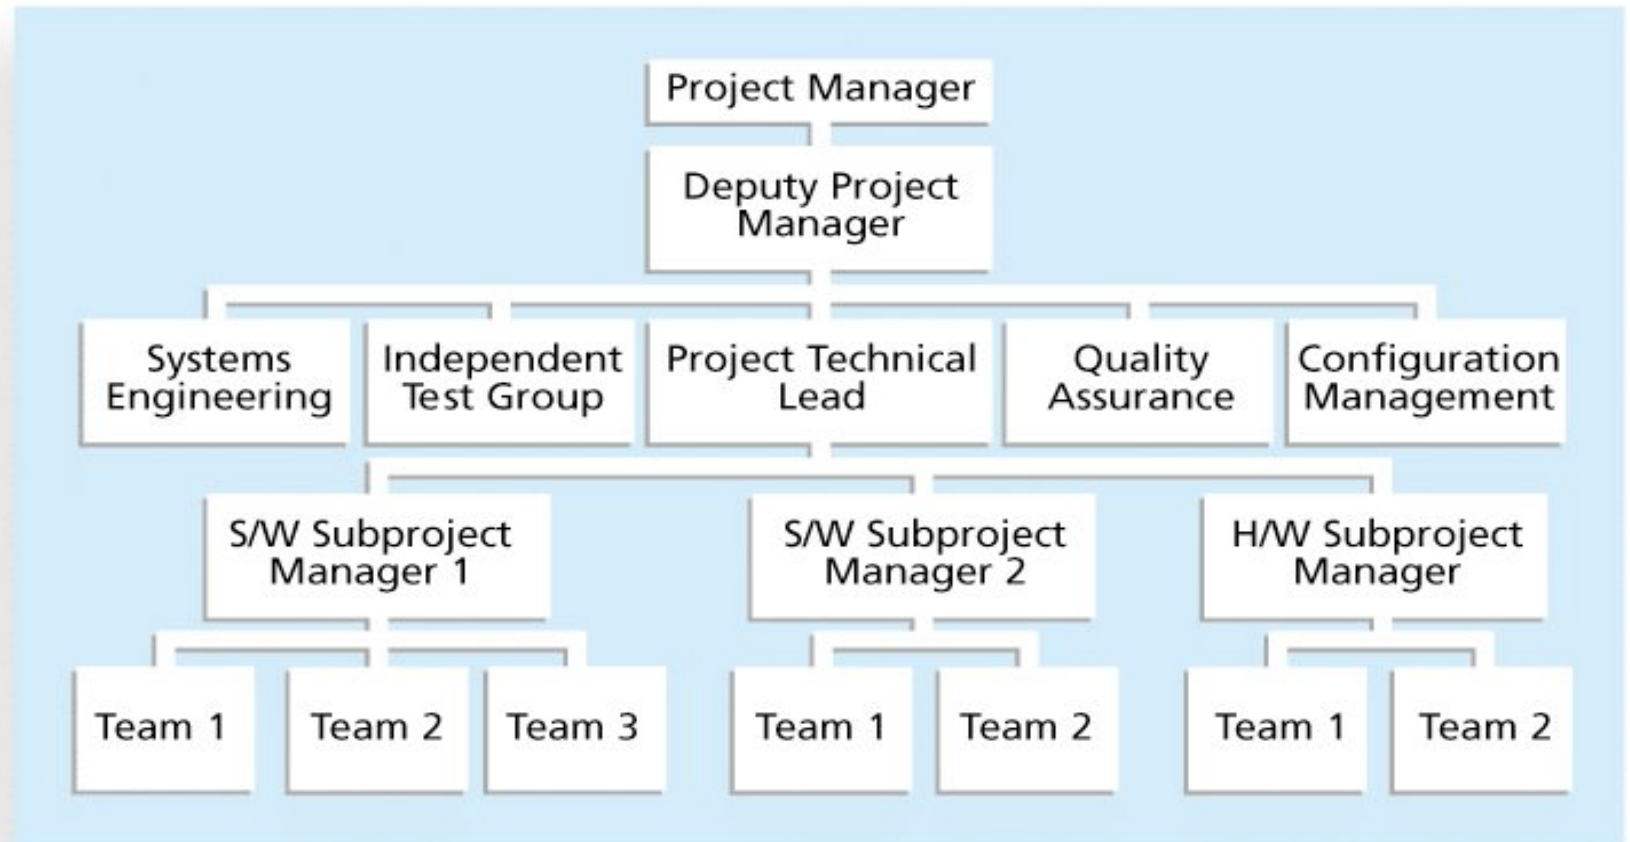

Proses Identifikasi dan Penugasan Proyek

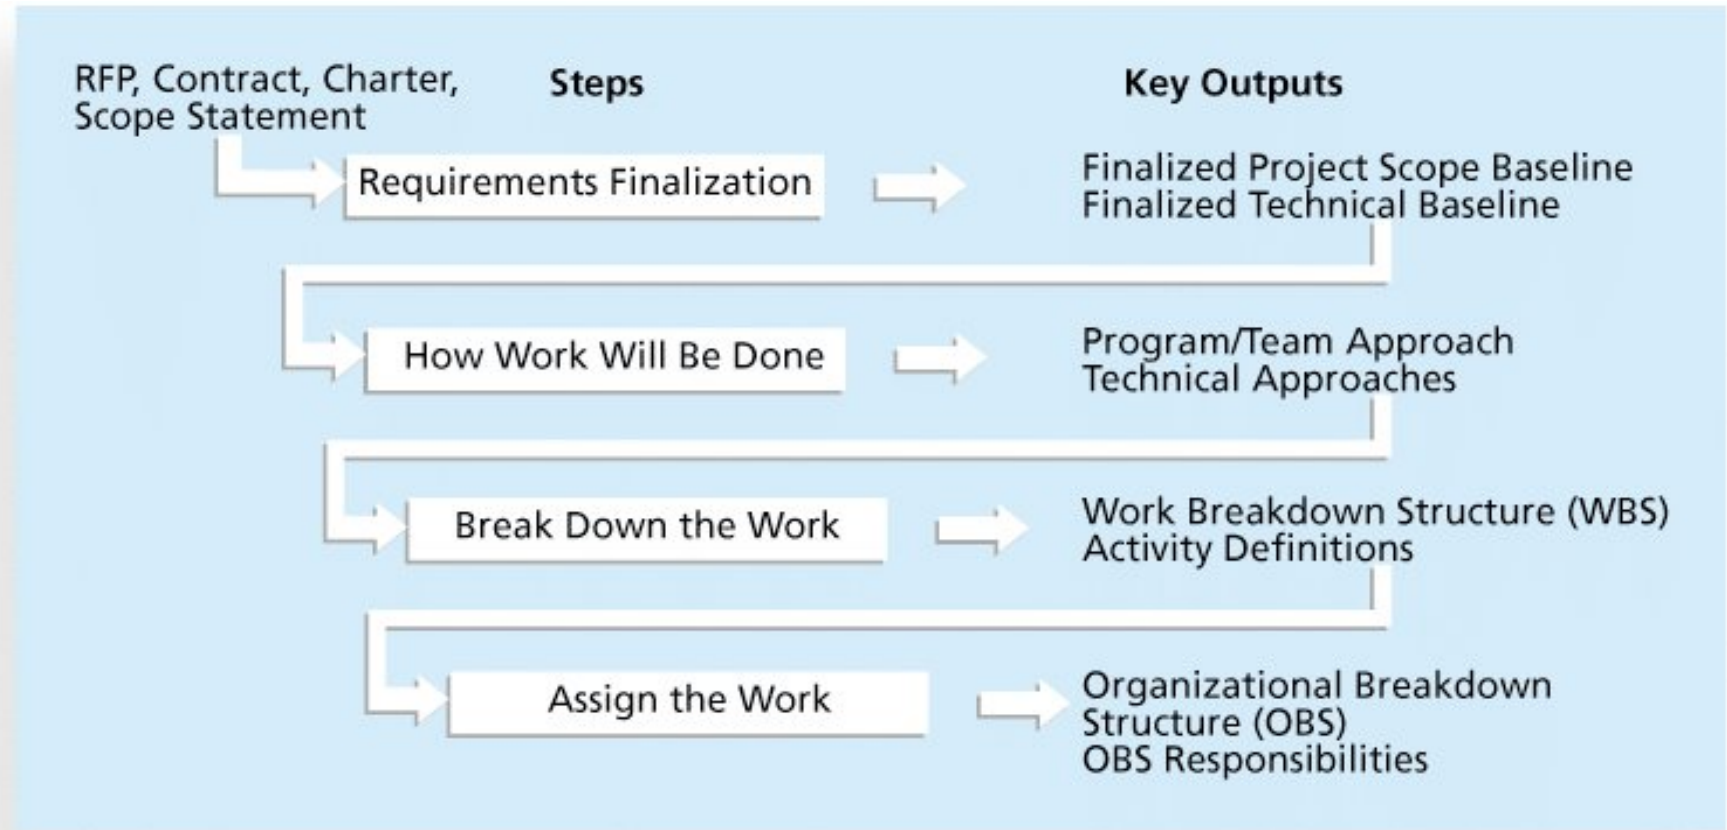

RAM



- A **responsibility assignment matrix (RAM)**
MATRIX yang digunakan untuk memetakan penjabaran proyek dalam WBS (work breakdown schedule) untuk menjabarkan tanggung jawab setiap SDM yang tergabung dalam tim proyek.
- Can be created in different ways to meet unique project needs

RAM



WBS activities →

OBS units ↓

	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8
Systems Engineering	R	R P					R	
Software Development			R P					
Hardware Development				R P				
Test Engineering	P							
Quality Assurance					R P			
Configuration Management						R P		
Integrated Logistics Support							P	
Training								R P


R = Responsible organizational unit
P = Performing organizational unit

Tim Proyek



- Tujuan utama dalam pembangunan tim adalah untuk membantu sumber daya manusia berkerjasama dengan lebih efektif sehingga dapat mengimprove performen proyek.
- Untuk menyelesaikan proyek diperlukan suatu tim yang sukses terlebih dahulu

Model Tuckman

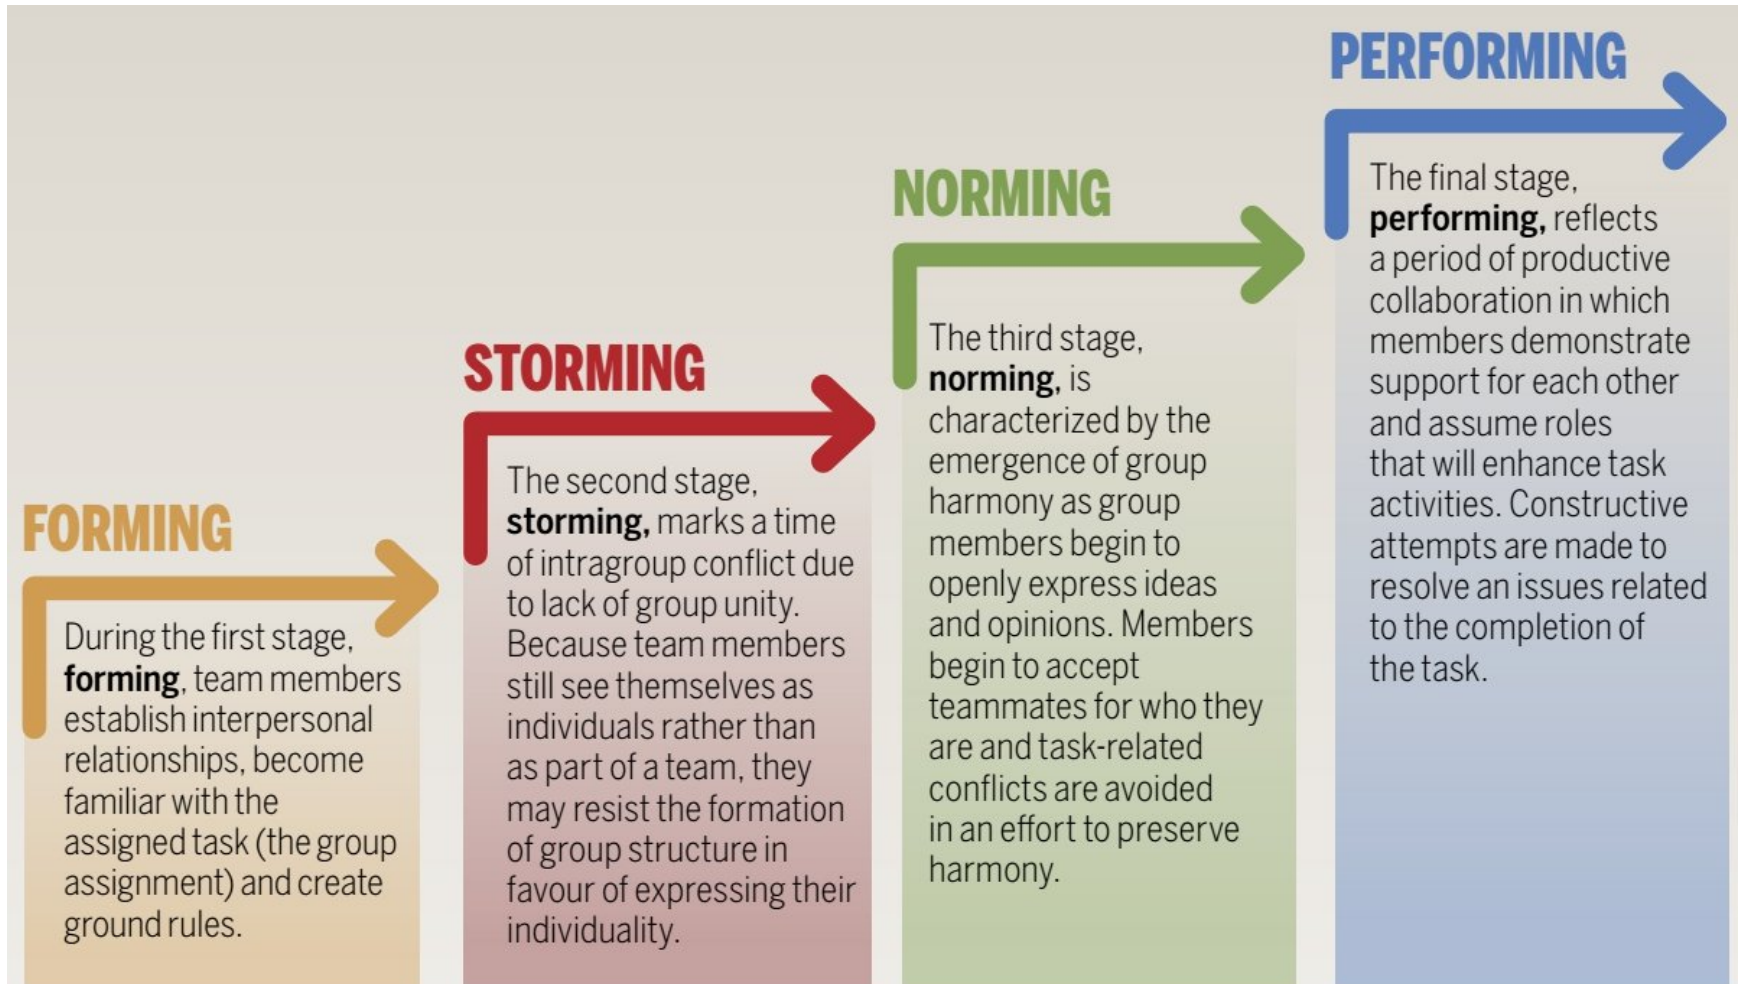

Training




- Membantu Sumber daya manusia memahami diri mereka, mereka dengan tim dan bagaimana bekerjasama dalam suatu tim itu lebih diutamakan.
- Membangun aktifitas tim, yang meliputi:
 - physical challenges
 - psychological preference indicator tools

Socail Style Profile



- Sumber daya manusia dipersepsikan berperilaku dalam 4 zona, berdasarkan ketegasan dan tanggung jawab:
 - Drivers
 - Expressives
 - Analyticals
 - Amiables
- People on opposite corners (drivers and amiables, analyticals and expressives) may have difficulties getting along

Socail Style Profile

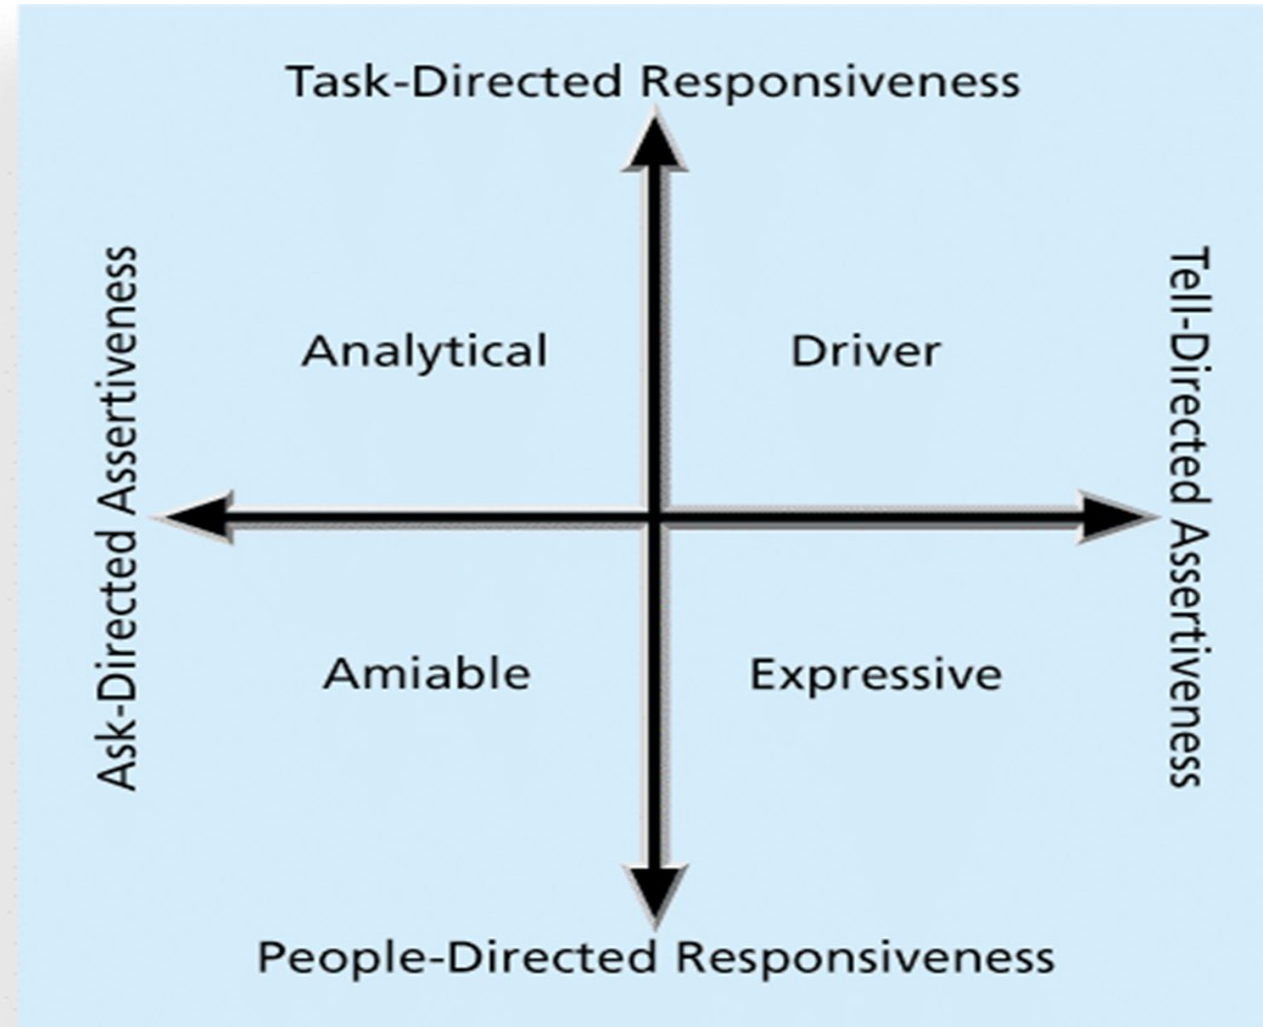

Manajemen Tim Proyek



- Project managers harus memimpin timnya dalam menampilkan mberbagai aktifitas proyek.
- Setelah memberikan penilaian performan tim proyek dan informasi yang berkaitan, manager proyek perlu memutuskan:
 - if changes should be requested to the project
 - if corrective or preventive actions should be recommended
 - if updates are needed to the project management plan or organizational process assets.

Tools dan Teknik Manajemen Tim Proyek



- Observation and conversation
- Project performance appraisals
- Interpersonal skills
- Conflict management

Manajemen Konflik



1. **Confrontation** : Menghadapi konflik secara langsung dengan pendekatan *problem solving*
2. **Compromise**: Pendekatan take and give
3. **Smoothing**: Meminimalisir perbedaan dan mensupport adanya kesepakatan
4. **Forcing**: Pendekatan win-lose
5. **Withdrawal**: mundur atau mencabut adanya potensial disagreement
6. **Collaborating**: Decision makers incorporate different viewpoints and insights to develop consensus and commitment

Manajemen Konflik



Relationship Importance

High

Smoothing/
Accommodating

Confrontation/
Problem-solving

Collaborating

Medium

Compromise

Low

Withdrawal/
Avoidance

Forcing

Low

Medium

High

Task Importance



THANKS
